CAMPUS DES BÂTISSEURS · FORMATION

Structurer un projet solide de A à Z

Les 5 étapes indispensables

La méthode pas à pas pour passer d’une idée à un projet qui aboutit, et qui dure



Connecter • Accompagner • Bâtir · campusdesbatisseurs.com

LA PROMESSE

À la fin, tu as un dossier de projet complet



Une méthode universelle

Les mêmes 5 étapes pour une boutique, une ONG, un élevage, un chantier ou un projet informatique



Un exemple fil rouge

Le projet d'Awa, suivi de la première à la dernière étape : tu vois la méthode appliquée



Un livrable par étape

5 documents qui forment ton dossier : pour avancer, convaincre et aller au bout



Pensé pour nos réalités

Financement limité, informel, famille, saisons, imprévus : tout est pris en compte

POUR QUI ?

Porteurs de projets, entrepreneurs, responsables d'associations, chefs de service, étudiants, membres de la diaspora qui investissent au pays.

LE CONSTAT

Pourquoi tant de projets s'arrêtent au bout de 6 mois

✕ On commence par le milieu	On achète le matériel avant de savoir précisément ce qu'on veut faire	→ Étape 1 : Clarifier
✕ On ne vérifie pas le besoin	On suppose que les clients viendront	→ Étape 2 : Valider
✕ On n'a pas de plan	Ni calendrier, ni budget détaillé, ni répartition des rôles	→ Étape 3 : Planifier
✕ On ne suit rien	On découvre les problèmes quand il est trop tard	→ Étape 4 : Exécuter et piloter
✕ On n'apprend rien	On répète les mêmes erreurs au projet suivant	→ Étape 5 : Clôturer et pérenniser

Ces projets n'échouent pas par manque de courage. Chaque erreur correspond à une étape oubliée.

LA MÉTHODE

5 étapes, 5 questions, 5 livrables



1	2	3	4	5
Clarifier	**Valider**	**Planifier**	**Exécuter et piloter**	**Clôturer et pérenniser**
Que voulons-nous exactement, et pourquoi ?	Le besoin est-il réel, le projet faisable et viable ?	Qui fait quoi, quand, avec quels moyens ?	Où en sommes-nous, et que corriger ?	Qu'avons-nous appris, et comment faire durer ?
Fiche projet	Dossier de validation	Plan de projet	Tableau de bord	Bilan final

Suis l'ordre : chaque étape s'appuie sur la précédente.

LE FIL ROUGE

Fais connaissance avec Awa et son projet



Awa, 31 ans, Thiès

Projet : un atelier de jus locaux

- Bissap, bouye, gingembre
- Formation en transformation agroalimentaire
- Un réseau dans l'événementiel
- De l'énergie, un peu d'épargne, une famille qui l'encourage

SA PEUR

Elle a entendu dix histoires de projets lancés dans l'enthousiasme et arrêtés au bout de six mois. Elle ne veut pas être la onzième.

CE QUE TU VAS VOIR

À chaque étape, Awa applique la méthode : ses chiffres, ses tableaux, ses erreurs et ses corrections. Fais la même chose avec ton projet, en parallèle.

MODE D'EMPLOI

Comment tirer le maximum de cette formation

Suis l'ordre

Chaque étape s'appuie sur la précédente. Ne saute jamais l'étape 2.

Applique en direct

Remplis les modèles du kit Excel avec ton projet réel, au fil des vidéos.

Suis Awa

Son atelier de jus illustre chaque outil, chiffres à l'appui.

Adapte l'effort

Petit projet : une page par étape. Gros projet : chaque livrable devient un dossier.

Ton kit Excel : fiche projet, grille d'entretien, calcul du seuil de rentabilité, matrice des risques, plan de tâches, RACI, budget, tableau de bord, bilan final et plan 30 jours. Les calculs se font tout seuls.

ÉTAPE 1

Clarifier



Savoir exactement ce que l’on veut. « Un projet flou produit des résultats flous. »

ÉTAPE 1

Quel problème ton projet résout-il, et pour qui ?

1 Quel problème, pour qui ?

Le besoin réel que tu veux satisfaire, et les personnes qui le vivent

2 Pourquoi maintenant ?

Ce qui rend le moment favorable : une demande, un manque, un changement

3 Pourquoi moi (ou nous) ?

Tes atouts : compétence, réseau, expérience, emplacement

Awa : « À Thiès, les jus locaux vendus dans la rue sont souvent de qualité irrégulière et mal conservés. Les bureaux, les écoles et les événements cherchent des jus locaux propres, bien emballés et livrés. J'ai une formation en transformation agroalimentaire et un réseau dans l'événementiel. »

Action : écris le pourquoi de ton projet en 2 phrases maximum. Si tu n'y arrives pas, le projet n'est pas encore clair.

ÉTAPE 1

Décris concrètement ce que le projet va produire

- Un produit
- Un service
- Un bâtiment
- Une formation
- Une organisation

> *Awa : « Un atelier qui produit et livre des jus de bissap, de bouye et de gingembre en bouteilles de 33 cl et de 1 litre, pour les entreprises, les écoles et les événements de Thiès. »*

Le test de la minute : une bonne description dit QUOI (le produit), COMMENT (le format, la livraison), POUR QUI (les clients) et OÙ (la zone). Un inconnu doit comprendre en une minute.

Action : décris ton projet en une phrase qui contient quoi, comment, pour qui et où. Lis-la à un proche.

ÉTAPE 1

Un objectif SMART : précis, chiffré, daté

S Spécifique

M Mesurable

A Atteignable

R Réaliste

T Temporel

Objectif flou	Objectif SMART
« Réussir mon atelier »	« Vendre 1 500 bouteilles par mois d'ici 6 mois, avec au moins 10 clients réguliers »
« Former des jeunes »	« Former 40 jeunes au montage de réseaux informatiques d'ici juin, avec 75 % de réussite à l'évaluation finale »
« Construire ma maison »	« Achever le gros œuvre d'une maison de 3 pièces à Mbour avant la fin de l'année, pour 12 millions de FCFA maximum »

À retenir : si tu ne peux pas dire, à une date précise, « objectif atteint » ou « pas atteint », ton objectif n'est pas SMART.

Action : réécris ton objectif en SMART : un chiffre, une date, un niveau de qualité.

ÉTAPE 1

Ce qui est dans le projet, et ce qui reste dehors

DANS LE PROJET

- Jus de bissap, bouye, gingembre
- Livraison à Thiès
- Clients : entreprises, écoles, événements

HORS DU PROJET (POUR L'INSTANT)

- Jus importés, boissons gazeuses
- Livraison dans les autres villes
- Vente en grande surface

EXEMPLE FIL ROUGE · AWA

À retenir : beaucoup de projets dérapent parce qu'on y ajoute sans cesse de nouvelles idées. « Hors du projet » ne veut pas dire « jamais » : ça veut dire « pas maintenant ».

ÉTAPE 1

Qui peut aider ton projet, et qui peut le bloquer ?

Partie prenante	Ce qu'elle attend	Ce qu'elle peut apporter	Ce qu'elle peut bloquer
Clients (bureaux, écoles)	Qualité, régularité, livraison à l'heure	Commandes, bouche-à-oreille	Le chiffre d'affaires
Famille	Que le projet réussisse, et parfois des emplois	Soutien, épargne, main-d'œuvre	Le temps, l'argent, les décisions
Fournisseurs	Être payés à temps	Ingrédients, bouteilles, délais de paiement	La production
Financeur (tontine, microcrédit)	Être remboursé	Le complément de financement	Le démarrage
Autorités	Le respect des normes	Les autorisations	L'ouverture de l'atelier

EXEMPLE FIL ROUGE · AWA

Exemple construit pour illustrer la méthode à partir du projet d'Awa.

Action : liste au moins 6 parties prenantes de ton projet. Pour chacune : ce qu'elle attend, apporte ou peut bloquer.

ÉTAPE 1

Contraintes et critères de réussite

Budget disponible

Combien peux-tu y mettre, au maximum ?

Temps

Quelle date limite ? Combien d'heures par semaine ?

Ressources

Compétences, matériel, local, équipe

Critères de réussite

À quoi sauras-tu, dans un an, que le projet est réussi ?

Pourquoi c'est vital : sans limite écrite, un projet consomme tout ce qu'on lui donne. Le budget maximum et la date limite sont des garde-fous, pas des contraintes.

Action : écris ton budget maximum, ta date limite, tes heures par semaine et 3 critères de réussite chiffrés.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1 · CLARIFIER · LE LIVRABLE

La fiche projet : tout ton projet sur une seule page

Nom du projet	Atelier de jus locaux d'Awa
Problème	Jus de rue irréguliers ; demande de jus propres et livrés
Projet en une phrase	Produire et livrer des jus locaux en bouteilles à Thiès
Objectif SMART	1 500 bouteilles/mois d'ici 6 mois, 10 clients réguliers
Périmètre	Bissap, bouye, gingembre · Thiès · pros et événements
Clients	Entreprises, écoles, organisateurs d'événements
Budget max · date	Environ 2,6 millions FCFA · lancement en 8 semaines
Critères de réussite	Seuil de rentabilité dépassé, clients fidèles, zéro incident

Fiche d'Awa, construite à partir des éléments de l'étape 1.

LE TEST DE LA FICHE

Si tu n'arrives pas à remplir une rubrique, c'est un signal : le projet n'est pas encore assez clair.

Modèle prêt à remplir : onglet « 1 Fiche projet » du kit Excel.

ÉTAPE 1

Les 3 erreurs à éviter à l'étape 1

Confondre l'idée et le projet

Une idée est une envie. Un projet a un objectif, un périmètre, des moyens et une date.

Viser trop large

Mieux vaut un petit projet qui réussit qu'un grand projet qui s'arrête.

Garder tout dans sa tête

Un projet non écrit change chaque semaine. Écrire, c'est décider.

À retenir : commencer petit n'est pas manquer d'ambition. C'est la façon la plus sûre de grandir : Awa commence par Thiès, avant de penser à Mbour.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1 · CLARIFIER · CHECKLIST

Checklist de l'étape 1 : es-tu prêt pour la suite ?

- [ ] Le problème ou l'opportunité est écrit en 2 phrases
- [ ] Les parties prenantes sont listées
- [ ] Le projet est décrit concrètement
- [ ] Budget, délai et critères de réussite sont fixés
- [ ] L'objectif est SMART
- [ ] La fiche projet tient sur une page
- [ ] Le périmètre précise ce qui est dedans et dehors

À retenir : une seule case vide ? Reviens dessus maintenant. Une heure de clarté ici évite des semaines de confusion plus tard.

ÉTAPE 2

Valider



Vérifier avant d’investir. « Une semaine de vérification peut éviter des années de regrets. »

ÉTAPE 2

Le besoin est-il réel ? Vont-ils payer ?

Interroge

15 à 20 clients potentiels, sur ce qu'ils font déjà

Observe

Où ils achètent aujourd'hui, à quel prix, avec quelles plaintes

Teste en petit

Précommande, échantillon, atelier pilote, première commande

LES BONNES QUESTIONS

- ✓ « Comment faites-vous aujourd'hui ? »
- ✓ « Combien ça vous coûte ? »
- ✓ « Qu'est-ce qui vous gêne ? »

LA QUESTION PIÈGE

« Est-ce que vous achèteriez mon jus ? » Tout le monde dit oui pour te faire plaisir. Interroge sur ce qu'ils FONT, pas sur ce qu'ils FERAIENT peut-être.

À retenir : une précommande payée vaut plus que cent « bonne idée ! ». L'argent est la seule preuve qui ne ment pas.

ÉTAPE 2

De 18 entretiens à 4 demandes de devis

18 responsables interrogés
entreprises, écoles, organisateurs d'événements

12 achètent déjà des boissons
pour leurs réunions ou leurs fêtes : le besoin existe

200 bouteilles test, 3 événements
tout est vendu : le produit plaît

4 demandes de devis
pour des livraisons régulières : on est prêt à payer

EXEMPLE FIL ROUGE · AWA

Coût du test : quelques jours et 200 bouteilles. Gain : la certitude que des clients paient.

ÉTAPE 2

Concurrents, taille du marché, différence

Les concurrents

Qui sont-ils ? Quels prix ? Quelles forces, quelles faiblesses ?

La taille du marché

Combien de clients potentiels dans ta zone ? Une estimation simple suffit.

Ta différence

Qualité, prix, service, proximité, confiance : pourquoi toi ?

Concurrent	Prix	Forces	Faiblesses	Ma différence
Vendeuses de rue	Bas	Partout, pas cher	Qualité et conservation irrégulières	Hygiène, emballage, régularité
Boissons industrielles	Moyen	Marques connues, disponibles	Pas local, souvent gazeuses	Local, naturel, livré
Traiteurs	Élevé	Service complet	Chers pour les simples réunions	Prix pro, livraison seule

Tableau de concurrence illustratif, construit pour l'exemple d'Awa : à refaire avec tes observations de terrain.

ÉTAPE 2

Les 4 faisabilités à vérifier

Technique

Sais-je produire ce que je promets, avec quel matériel ?

Awa : Recettes stabilisées, matériel de base identifié

Financière

Les recettes couvriront-elles les coûts, et en combien de temps ?

Awa : Voir le calcul du seuil de rentabilité

Juridique

Quelles autorisations, quelles normes, quel statut ?

Awa : Autorisations sanitaires et enregistrement de l'entreprise

Humaine

Ai-je les compétences et le temps, ou les bonnes personnes ?


Awa : Une aide à mi-temps, un livreur à la tâche

À retenir : renseigne-toi sur les autorisations DÈS MAINTENANT : c'est souvent ce qui prend le plus de temps.

ÉTAPE 2

Le seuil de rentabilité : le calcul qui dit oui ou non

Coût variable par bouteille (ingrédients, bouteille, étiquette)	300 FCFA
Prix de vente aux professionnels	500 FCFA
Marge par bouteille	200 FCFA
Charges fixes par mois (local, énergie, aide, transport)	250 000 FCFA
Seuil de rentabilité = charges fixes ÷ marge	**1 250 bouteilles/mois**
Objectif SMART	1 500 bouteilles/mois

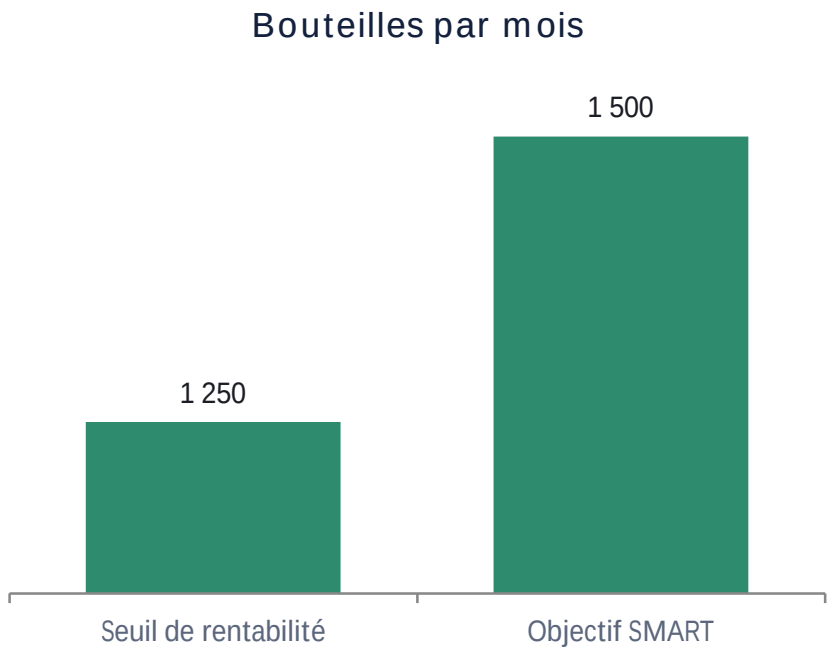


EXEMPLE FIL ROUGE · AWA

À retenir : l'objectif dépasse le seuil : le projet peut être rentable, si le volume est atteint. Sous le seuil, il faut revoir le prix, les coûts ou le projet.

ÉTAPE 2

Identifie tes 5 principaux risques, et note-les

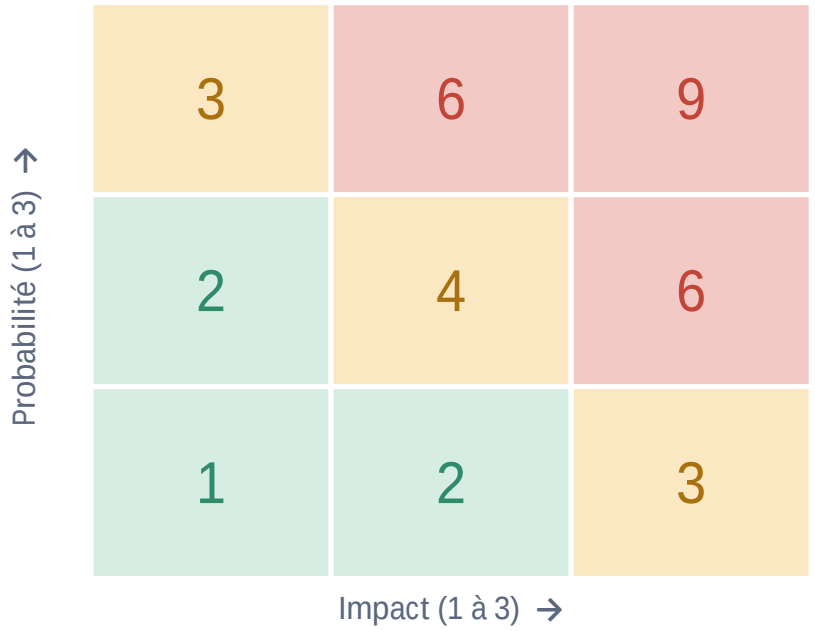

Risque d'Awa	P	I	Score
Retard de paiement des clients	3	2	6
Problème d'hygiène	1	3	3
Panne du réfrigérateur	2	3	6
Hausse du prix du sucre	2	2	4
Départ de l'aide	2	2	4

Les 5 risques sont ceux d'Awa ; les notes P et I sont un exemple de notation.

Score = probabilité × impact. Priorité aux scores de 6 et 9.

Action : liste tes 5 risques principaux et note-les dans la matrice du kit Excel : le score se calcule seul.

ÉTAPE 2

Continuer, ajuster ou arrêter : une décision écrite

CONTINUER

Le besoin est confirmé, le projet est faisable et peut être rentable.

AJUSTER

Le besoin existe, mais il faut changer le client, le prix, la taille ou l'offre.

ARRÊTER

Le besoin n'est pas confirmé ou le projet n'est pas viable.

Arrêter maintenant, c'est réussir : tu viens d'économiser ton argent et ton temps. Awa, elle, décide de CONTINUER : besoin confirmé, faisable, rentable au-dessus de 1 250 bouteilles.

Action : écris ta décision et ses 3 raisons principales. Montre-la à une personne de confiance.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2 · VALIDER · LE LIVRABLE

Le dossier de validation : des faits, pas des espoirs

- Notes des entretiens
- Résultats du test
- Tableau de concurrence
- Les 4 faisabilités
- Calcul du seuil
- Top 5 des risques
- La décision écrite

LE LIVRABLE : DOSSIER DE VALIDATION il te sert à décider, et à convaincre un associé, un financeur ou ta famille avec des faits, pas des espoirs.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2 · VALIDER · CHECKLIST

Checklist de l’étape 2 : es-tu prêt pour la suite ?

- [ ] Au moins 15 entretiens réalisés
- [ ] Seuil de rentabilité calculé
- [ ] Un test en petit réalisé
- [ ] Top 5 des risques identifié
- [ ] Concurrence analysée
- [ ] Décision écrite : continuer, ajuster ou arrêter
- [ ] Faisabilité technique, financière, juridique et humaine vérifiée

À retenir : tant que ces cases ne sont pas cochées, ne dépense pas l’essentiel de ton argent. C’est la règle qui protège le plus ton capital.

ÉTAPE 3

Planifier



Transformer le projet en actions. « Un objectif sans plan n’est qu’un souhait. »

ÉTAPE 3


Des lots, puis des tâches de quelques jours

Lot	Tâches principales (exemple d'Awa)
1. Administratif	Enregistrer l'entreprise, demander les autorisations sanitaires, ouvrir un compte dédié
2. Local et équipement	Trouver et aménager le local, acheter réfrigérateur, cuves, matériel d'embouteillage
3. Produit et fournisseurs	Fixer les recettes, choisir 2 fournisseurs par ingrédient, commander bouteilles et étiquettes
4. Commercial	Liste de 50 clients cibles, tarifs, plaquette, page Facebook et WhatsApp Business
5. Lancement	Production test, dégustation de lancement, premières livraisons

La règle : 4 à 7 lots (grands blocs de travail), et des tâches assez petites pour être faites en quelques jours au plus.

ÉTAPE 3

8 semaines, 6 jalons : le planning d'Awa

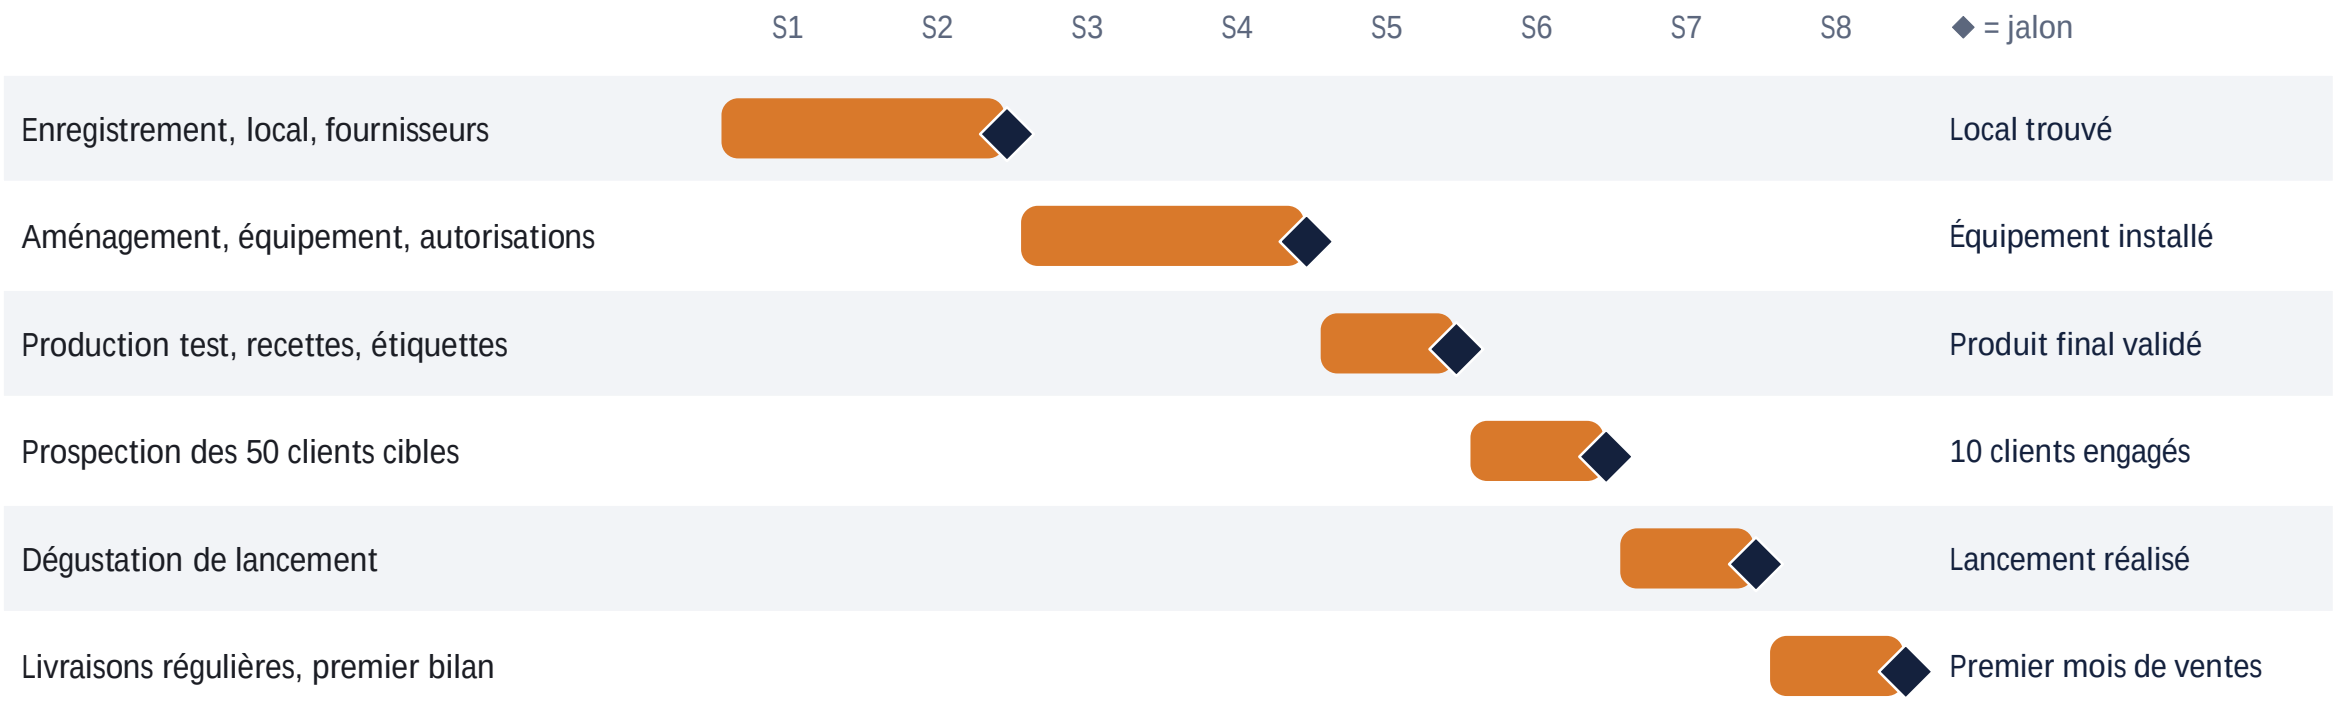

À retenir : prévois une marge. Démarches administratives, livraisons de matériel et travaux prennent souvent plus de temps que prévu.

ÉTAPE 3

Un seul responsable par lot : la méthode RACI

R	Réalise	Fait le travail
A	Approuve	Décide et rend des comptes : une seule personne
C	Consulté	Donne son avis avant
I	Informé	Est tenu au courant après


Lot	Awa	Aide	Livreur	Famille
Administratif	R / A			C
Local et équipement	A	R		C
Produit et fournisseurs	R / A	C		
Commercial	R / A		I	I
Lancement	A	R	R	I

Tableau RACI illustratif pour l'équipe d'Awa.

À retenir : même à deux ou trois, désigne UN responsable par lot. « Tout le monde s'en occupe » veut souvent dire « personne ne s'en occupe ».

ÉTAPE 3

Le budget de démarrage : n'oublie rien

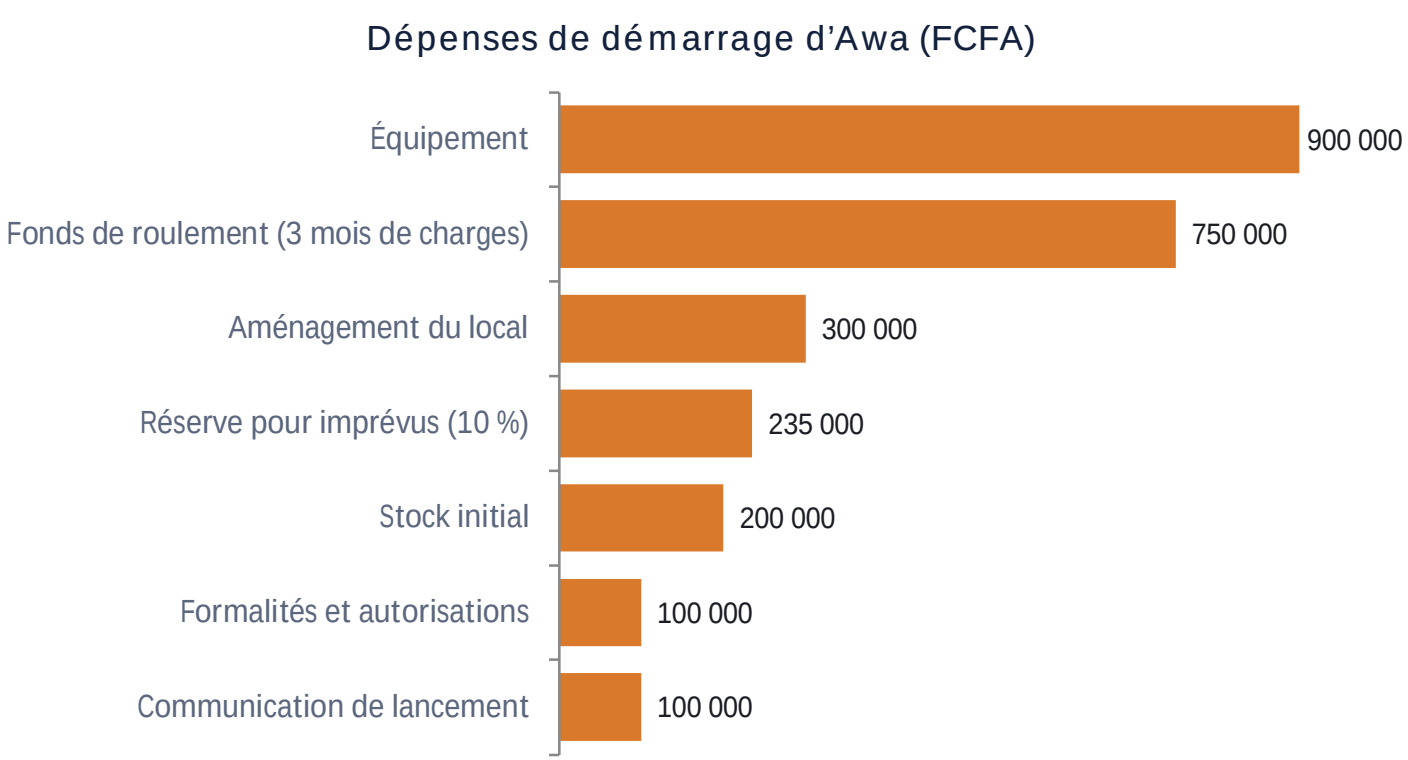

TOTAL

2 585 000 FCFA

LES 2 LIGNES QU'ON OUBLIE


- Le fonds de roulement : 3 mois de charges fixes pour tenir avant que les ventes arrivent.
- La réserve pour imprévus : 10 à 15 % du budget.

EXEMPLE FIL ROUGE · AWA

Fonds de roulement : 3 × 250 000 = 750 000. Réserve : 10 % de 2 350 000 = 235 000.

ÉTAPE 3

Le financement : ressources = dépenses

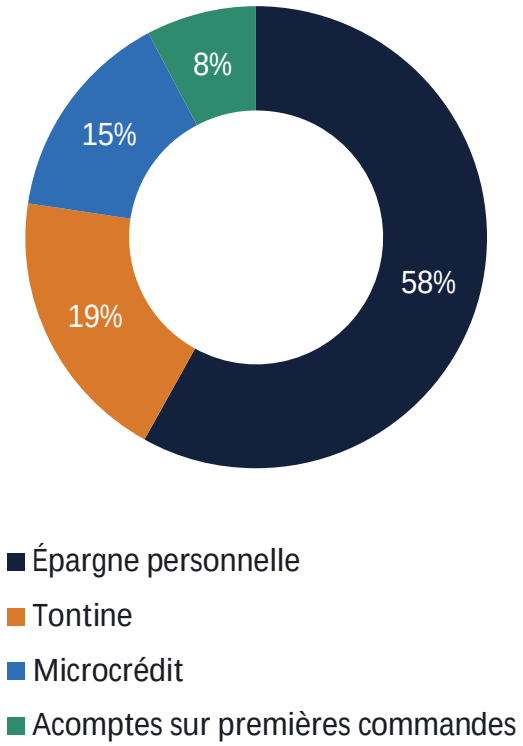

Ressources	Montant
Épargne personnelle	1 500 000 FCFA
Tontine	500 000 FCFA
Microcrédit	385 000 FCFA
Acomptes sur premières commandes	200 000 FCFA
Total	2 585 000 FCFA

2 règles d'or : les ressources doivent égaler les dépenses ; une réserve de 10 à 15 % évite qu'un seul imprévu arrête tout le projet.

ÉTAPE 3

Pour chaque risque : prévenir, et savoir quoi faire

Risque	Action préventive	Si le risque arrive
Retard de paiement	Acompte de 30 % à la commande, paiement à 15 jours maximum	Relance écrite, suspension des livraisons au client
Panne du réfrigérateur	Contrat avec un réparateur, entretien régulier	Glacières de secours, production réduite
Hausse du prix du sucre	Stock de sécurité, 2 fournisseurs	Ajuster la recette ou le prix
Problème d'hygiène	Procédure de nettoyage écrite, contrôle quotidien	Retrait du lot, information des clients
Départ de l'aide	Recettes et procédures écrites	Former rapidement une remplaçante

Les 2 premières ripostes sont celles d'Awa ; les autres sont des exemples pour compléter la méthode.

Action : pour chacun de tes 5 risques, écris une action préventive et une action si le risque arrive.

ÉTAPE 3

Qui doit être informé de quoi, et quand ?

Qui	Quoi	Quand	Comment
Associés, équipe	Avancement, priorités, problèmes	Chaque semaine	Point de 30 minutes
Famille	Grandes étapes, décisions importantes	Chaque mois	Discussion à la maison
Financeur (tontine, microcrédit)	Ventes, remboursements	Chaque mois	Message ou rencontre
Clients	Nouveautés, délais, changements	À chaque changement	WhatsApp Business

Plan de communication illustratif.

LE LIVRABLE : PLAN DE PROJET lots et tâches, calendrier et jalons, rôles, budget et financement, riposte aux risques, communication.

ÉTAPE 3

Checklist de l’étape 3 : es-tu prêt pour la suite ?

- [ ] Le projet est découpé en 4 à 7 lots et en tâches courtes
- [ ] Le plan de financement équilibre les dépenses
- [ ] Le calendrier comporte des jalons et une marge
- [ ] Chaque risque majeur a sa parade
- [ ] Chaque lot a un responsable unique
- [ ] Le plan de communication est défini
- [ ] Le budget inclut fonds de roulement et réserve

À retenir : ton plan est prêt quand une autre personne peut le lire et savoir exactement quoi faire demain matin.

ÉTAPE 4

Exécuter et piloter



Avancer et garder le cap. « Le plan ne se déroule jamais exactement comme prévu. »

ÉTAPE 4

Une réunion de lancement, puis 3 rituels

LA RÉUNION DE LANCEMENT

1. Rappel de l'objectif
2. Présentation du plan
3. Rôles de chacun
4. Règles de fonctionnement
5. Prochaines étapes

Même à 2 ou 3 personnes : ce moment crée l'engagement.

30 min

Point d'avancement · Chaque semaine

Ce qui est fait, ce qui bloque, les priorités de la semaine

1 h

Revue du tableau de bord · Chaque mois

Indicateurs, budget, risques, décisions à prendre

1 à 2 h

Revue de jalon · À chaque jalon

Le jalon est-il atteint ? Faut-il ajuster le plan ?

Action : fixe dès aujourd'hui le jour et l'heure de ton point hebdomadaire, et mets-le dans ton agenda.

ÉTAPE 4

5 à 8 indicateurs, un code couleur, une seule page

Indicateur	Objectif	Réalisé	État
Avancement des tâches	100 % des tâches du mois	85 %	
Budget dépensé	2 585 000 FCFA au total	Dans les prévisions	
Bouteilles vendues ce mois	1 250 (seuil)	900	
Clients réguliers	10	7	
Réclamations qualité	0	1	
Trésorerie disponible	Au moins 1 mois de charges	1,5 mois	

Conforme · À surveiller · Action immédiate

EXEMPLE FIL ROUGE · AWA

À retenir : plus de 8 indicateurs, et tu ne regardes plus rien. Choisis ceux qui disent si ton objectif SMART sera atteint.

ÉTAPE 4

La méthode en 4 temps, appliquée par Awa

1 Constater

Quel est l'écart, chiffres à l'appui ?

Awa : 900 bouteilles vendues au lieu de 1 250

2 Comprendre

Quelle est la vraie cause ? Demande « pourquoi » plusieurs fois

Awa : Les écoles, un tiers des clients, sont en vacances

3 Décider

Quelle action, par qui, pour quand ?

Awa : Mariages et baptêmes, format 1 litre pour les familles

4 Vérifier

Au point suivant, l'action a-t-elle produit son effet ?

Awa : Le mois suivant : 1 400 bouteilles



La leçon d'Awa : elle n'avait pas prévu la saisonnalité. Désormais, elle l'inscrit dans son plan. Un écart bien traité rend le projet plus solide.

ÉTAPE 4

Filtrer les idées, garder la trace

« ET SI ON VENDAIT AUSSI DES GLACES ? »

1. Impact : sur l'objectif, le délai, le budget, les risques ?
2. Qui décide ? La personne « A » du tableau des rôles.
3. Accepté : mets à jour le plan et informe les parties prenantes.
4. Refusé : note l'idée pour plus tard.

LE JOURNAL DE PROJET

Date	Décision	Raison	Resp.
Mois 2	Format 1 litre	Écoles en vacances	Awa
Mois 2	Prospecter mariages	Compenser la baisse	Awa
Mois 3	Glaces : plus tard	Hors périmètre	Awa

Dans 6 mois, tu sauras pourquoi tu as fait chaque choix.

LE LIVRABLE : TABLEAU DE BORD À JOUR mis à jour chaque mois, accompagné du journal de projet.

ÉTAPE 4

Les 4 erreurs qui font dérailler un projet lancé

Ne plus regarder le plan

Une fois lancé, le plan reste dans un tiroir

Cacher les mauvaises nouvelles

Plus un problème est connu tôt, moins il coûte

Accepter tous les changements

Sans mesurer leur impact sur le délai et le budget

Mélanger les caisses

L'argent du projet et l'argent personnel dans la même poche

À retenir : ouvre un compte dédié au projet dès la semaine 1 (c'est dans le lot administratif d'Awa). C'est la base de tout pilotage honnête.

ÉTAPE 4

Checklist de l’étape 4 : es-tu prêt pour la suite ?

- [ ] Réunion de lancement réalisée
- [ ] Point hebdomadaire et revue mensuelle installés
- [ ] Tableau de bord de 5 à 8 indicateurs avec code couleur
- [ ] Chaque écart traité avec la méthode en 4 temps
- [ ] Changements évalués avant d’être acceptés
- [ ] Journal de projet tenu à jour

À retenir : le pilotage n’est pas une étape qu’on coche une fois : c’est un rythme. Chaque semaine, chaque mois, jusqu’à la fin du projet.

ÉTAPE 5

Clôturer et pérenniser



Finir proprement et faire durer. « Un projet n’est fini que quand on en a tiré toutes les leçons. »

ÉTAPE 5

Fin du projet, ou début d'une activité ?

Projet ponctuel

Exemples : Construction, événement, formation, campagne

Clôturer, c'est : Livrer, faire le bilan, fermer les comptes du projet

Projet qui devient une activité

Exemples : Entreprise, association, service

Clôturer, c'est : Passer du « mode projet » au « mode fonctionnement normal », avec des règles stables

Awa : son atelier est un projet qui devient une activité. Après 6 mois, elle passe en « mode fonctionnement » : procédures, revue mensuelle, objectifs annuels.

ÉTAPE 5

Comparer le prévu et le réalisé, chiffres à l'appui

Critère	Prévu	Réalisé	Écart	Explication
Objectif principal	1 500 bouteilles/mois en 6 mois	1 600	+ 7 %	Les événements ont compensé les vacances scolaires
Clients réguliers	10	14	+ 4	Le bouche-à-oreille des mariages
Budget de démarrage	2 585 000 FCFA	2 690 000 FCFA	+ 4 %	Travaux électriques imprévus, couverts par la réserve
Délai de lancement	8 semaines	10 semaines	+ 2 sem.	Autorisations plus longues que prévu

EXEMPLE FIL ROUGE · AWA

Bilan d'Awa à 6 mois.

À retenir : regarde la ligne budget : 105 000 FCFA de dépassement, absorbés par la réserve de 235 000. Sans réserve, ces travaux auraient bloqué le lancement.

ÉTAPE 5

4 questions pour tirer les leçons

1. Qu'est-ce qui a bien marché, et qu'il faut refaire ?
2. Qu'est-ce qui n'a pas marché, et pourquoi ?
3. Qu'est-ce qui nous a surpris ?
4. Que ferions-nous différemment la prochaine fois ?

CE QU'AWA RETIENT

- ✓ Prévoir la saisonnalité dès l'étape 3
- ✓ Demander les autorisations dès la semaine 1
- ✓ Exiger un acompte à chaque commande

Réunis l'équipe, ou prends une heure seul avec ton journal de projet.

Action : même si ton projet est en cours, réponds aujourd'hui aux 4 questions sur le dernier mois.

ÉTAPE 5

Un dossier rangé, une activité qui tourne sans toi

LE DOSSIER DU PROJET

- 01 Fiche projet
- 02 Dossier de validation
- 03 Plan de projet
- 04 Tableaux de bord
- 05 Journal de décisions
- 06 Contrats et factures
- 07 Bilan final

Écris les procédures

Production, livraison, facturation : pour pouvoir les confier

Forme un relais

Une personne capable de prendre le relais en ton absence

Garde le tableau de bord

Avec une revue mensuelle

Formalise

Statut, comptabilité, contrats

Fixe les objectifs

De l'année suivante

Ce dossier te servira pour un financement, un associé, un contrôle ou ton prochain projet.

ÉTAPE 5

Célébrer, puis recommencer



RECONNAÎTRE L'EFFORT

Marque la fin du projet avec ton équipe. Reconnaître le travail accompli renforce l'engagement pour la suite.

Awa : son prochain projet : un point de vente à Mbour. Elle recommence à l'étape 1, avec une méthode déjà rodée.

LE LIVRABLE : BILAN FINAL prévu / réalisé, retour d'expérience, dossier archivé, plan de pérennisation ou de clôture.

ÉTAPE 5

Checklist de l’étape 5 : es-tu prêt pour la suite ?

- [ ] Le bilan compare prévu et réalisé, chiffres à l’appui
- [ ] Les procédures clés sont écrites
- [ ] Le retour d’expérience répond aux 4 questions
- [ ] Une personne peut prendre le relais
- [ ] Tous les documents sont archivés au même endroit
- [ ] Les objectifs de la période suivante sont fixés

À retenir : les projets qui réussissent ne sont pas forcément ceux des plus talentueux. Ce sont ceux qui sont clairs, vérifiés, planifiés, pilotés et capitalisés.

PASSER À L'ACTION

Ton projet en 30 jours



Le kit Excel, le plan jour par jour et la synthèse de la méthode : tout pour commencer dès demain.

10 onglets prêts à remplir, les calculs se font seuls

Onglet	Étape	Ce qu'il fait pour toi
1 Fiche projet	1	Ton projet sur une page, rubrique par rubrique
2 Grille d'entretien	2	20 entretiens, avec le compte automatique des besoins confirmés
3 Seuil de rentabilité	2	Marge, seuil et verdict calculés à partir de tes coûts et de ton prix
4 Matrice des risques	2 et 3	Score P × I et priorité en couleur, avec les ripostes
5 Plan de tâches	3	Lots, tâches, responsables, dates, dépendances, état
6 Rôles RACI	3	Qui réalise, approuve, est consulté, est informé
7 Budget et financement	3	Réserve et totaux calculés, contrôle de l'équilibre
8 Tableau de bord	4	Taux de réalisation et état vert, orange, rouge automatiques
9 Bilan final	5	Écarts calculés et retour d'expérience
10 Plan 30 jours	Toutes	Ton calendrier d'action avec cases à cocher

Fichier fourni : Kit_Projet_5_etapes.xlsx. Une ligne d'exemple d'Awa dans chaque onglet ; les onglets 3 et 7 sont préremplis : remplace par tes chiffres.

Structurer ton projet en 30 jours, étape par étape

J1 à J3	Clarifier	Problème, projet, objectif SMART, périmètre, parties prenantes	Fiche projet
J4 à J12	Valider	15 à 20 entretiens, test en petit, concurrence, faisabilité, seuil, risques	Dossier de validation
J13 à J18	Planifier	Lots et tâches, calendrier, rôles, budget, financement, riposte	Plan de projet
J19 à J20	Lancer	Réunion de lancement, rituels, tableau de bord	Tableau de bord initial
J21 à J30	Piloter	Premières actions, premier point hebdomadaire, journal de projet	Tableau de bord à jour
Fin ou 6 mois	Clôturer	Bilan, retour d'expérience, archivage, procédures	Bilan final

Action : aujourd'hui même, ouvre l'onglet « 1 Fiche projet » et remplis la première rubrique.

Les 5 étapes, les 5 questions, les 5 livrables

Étape	La question	Le livrable	L'outil clé
1. Clarifier	Que voulons-nous exactement, et pourquoi ?	Fiche projet	Objectif SMART
2. Valider	Le besoin est-il réel, le projet faisable et viable ?	Dossier de validation	Seuil de rentabilité
3. Planifier	Qui fait quoi, quand, avec quels moyens ?	Plan de projet	Budget et RACI
4. Exécuter et piloter	Où en sommes-nous, et que corriger ?	Tableau de bord	Méthode en 4 temps
5. Clôturer et pérenniser	Qu'avons-nous appris, et comment faire durer ?	Bilan final	Retour d'expérience

Clair. Vérifié. Planifié. Piloté. Capitalisé.

Teste ta méthode : questions 1 à 4

1. Quelle est l'étape la plus souvent sautée, et celle qui fait le plus échouer ?

A. Clarifier

B. Valider

C. Clôturer

2. Lequel de ces objectifs est SMART ?

A. « Réussir mon atelier »

B. « Vendre plus de jus »

C. « 1 500 bouteilles/mois d'ici 6 mois »

3. Charges fixes 250 000 FCFA, marge 200 FCFA : le seuil de rentabilité est…

A. 500 unités/mois

B. 1 250 unités/mois

C. 2 500 unités/mois

4. Quelle question poser en entretien de validation ?

A. « Achèteriez-vous mon produit ? »

B. « Comment faites-vous aujourd'hui ? »

C. « Aimez-vous mon idée ? »

Teste ta méthode : questions 5 à 8

5. Dans un tableau RACI, combien de personnes « A » par lot ?

A. Une seule

B. Deux

C. Toute l'équipe

6. Quelle réserve pour imprévus prévoir dans le budget ?

A. 0 %, on verra

B. 10 à 15 %

C. 50 %

7. Un indicateur passe au rouge. Première action ?

A. Constater l'écart, chiffres à l'appui

B. Changer tout le plan

C. Attendre le mois suivant

8. Arrêter un projet à la fin de l'étape 2, c'est…

A. Un échec

B. Une perte de temps

C. Une réussite : argent et temps économisés

Les réponses et pourquoi

1 · B — Valider : on suppose que les clients viendront, sans vérifier.

2 · C — Chiffré, daté, vérifiable : on saura s'il est atteint.

3 · B — 250 000 ÷ 200 = 1 250 unités par mois.

4 · B — On interroge sur ce que les gens font, pas sur ce qu'ils feraient.

5 · A — Une seule personne décide et rend des comptes.

6 · B — 10 à 15 % : un seul imprévu ne doit pas tout arrêter.

7 · A — Constater, comprendre, décider, vérifier.

8 · C — Arrêter tôt évite de perdre beaucoup plus tard.

7 bonnes réponses ou plus : tu as la méthode. Moins de 6 : revois les étapes 2 et 3.

BÂTIR AVEC MÉTHODE

Cinq étapes. Cinq livrables. Un projet qui tient debout.

Commence aujourd'hui par la fiche projet. Une page suffit pour poser la première pierre.

Clarifier | Valider | Planifier | Exécuter | Clôturer

CAMPUS DES BÂTISSEURS

Connecter • Accompagner • Bâtir

campusdesbatisseurs.com

infos@campusdesbatisseurs.com

+221 76 760 22 22

YouTube · TikTok · Facebook

@campusdesbatisseurs

Retrouve-nous pour la suite : accompagnement, guides et formations.
